


武豊町屋内温水プールだより

第3号
武豊町役場スポーツ課
TEL：72-1111
令和3年7月15日発行

工事工程

4月より引続き本体工事を実施しています。地下1階と1階の床部分の本体工事が完了し、1階の壁部分から2階へと本体工事を進めるため、足場の組み立てを行っています。また、プール建物の鉄骨工事を行うために、作業用足場の工事を行いました。だんだん工事現場の外からも工事の様子が見えるようになってきました。今後も安全・環境に注意して工事を進めていきます。

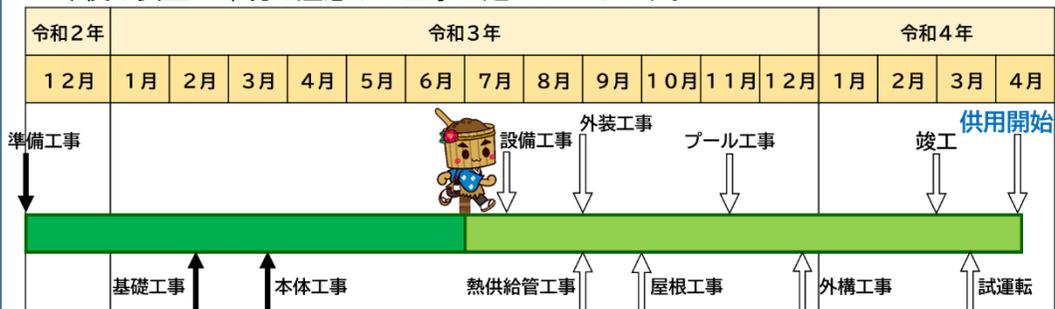

◎工事進捗率（6月末現在）：38.9%

工事状況



本体工事



1階床部分の本体工事が終わり、建物の壁部分の工事を行うため、コンクリートを流し込む型枠の工事を行っています。

建物の見た目や強度に直結するとても重要な工程になるため、一層注意して作業を進めています。



足場工事



プールエリアでは鉄骨工事に向けて作業用の構台（足場）の設置工事を行いました。

鉄骨工事用の重機が乗入れるため、とても頑丈なつくりになっています。



また、その外側では、1階壁部分から2階以降の本体工事を行うための足場を組み立てています。

外から見た現場の様子。工事が進むと建物の形も見えてきます！

◎お問合せ先：奥村・岩部建設共同企業体 武豊町 PFI 工事所（平日8時30分～17時00分）
◎住所：愛知県知多郡武豊町字忠白田 11-7 ◎TEL：0569-47-7780
