

# 武豊町屋内温水プールだより


第5号  
武豊町役場スポーツ課  
TEL：72-1111  
令和3年10月15日発行

## 工事工程

3月から行っている本体工事の完了が近づいてきました。

既に始まっている部分もありますが、本体工事が終わると内装工事・設備工事へと進めていきます。また、10月からは屋根工事・プール工事も始まります。

9月より進めている熱供給管工事につきましては、10月下旬から臨港道路部分の施工が始まります。一層安全・環境に注意して工事を進めてまいります。

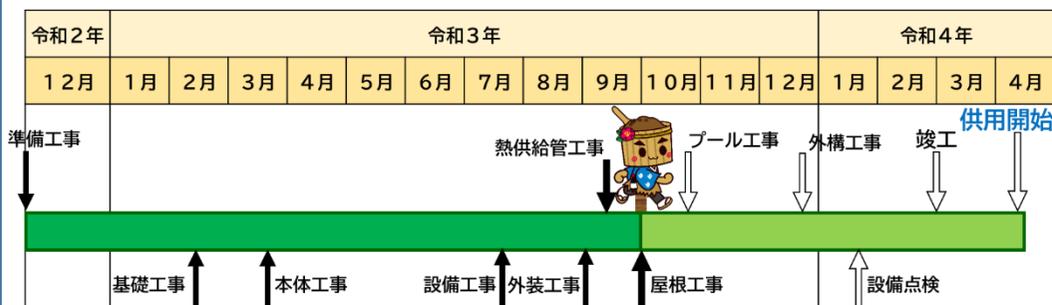

◎工事進捗率（9月30日現在）：55.6%

## 工事状況

7月下旬時



9月下旬 敷地北西より撮影

## 鉄骨工事

プールエリアの屋根工事を行うために、鉄骨工事を行いました。

鉄骨材を連結させて、プールエリアの上部に架けていきます。鉄骨材を連結させるときには、重さによる鉄骨材の変形を考慮して調整を行います。

その後、屋根材を乗せる部分とその補強材の鉄骨工事を行いました。

鉄骨工事の完了後は、屋根工事へと進んでいきます。



## 熱供給管工事に係る交通規制について（臨港道路）



9月より行っている熱供給管工事は、現在町道部分を施工しています。町道部分の工事が終わると、10月下旬より、臨港道路部分の工事が始まります。

工事期間中の9時～17時は交通規制として、片側交互通行を実施します。

道路を利用される皆さんには大変ご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願い致します。



◎お問合せ先：奥村・岩部建設共同企業体 武豊町 PFI 工事所（平日8時30分～17時00分）

◎住所：愛知県知多郡武豊町字忠白田 11-7 ◎TEL：0569-47-7780
